

擴堂開支


直至2010年6月24日有關用地圖則、建築證及銀行貸款申請等費用：

- 劃則師 + 工程顧問費用：	\$175,004.89
- 市政府（用地圖則申請）：	\$137,258.13
- 市政府（建築證申請）：	\$66,286.91
- 電力公司及天然氣公司：	\$50,298.15
- 教會物業估價費用（用作申請銀行建築貸款之用）：	\$6,930.00
- 銀行建築貸款申請費：	\$7,500.00
- 律師費用：	\$19,615.89
- 建築經理聘用費：	\$15,067.50
合共：	\$477,961.47

建築工程開支（直至2010年5月31日）：**\$124,527.70**

建築預算：**\$3,489,314.20**

08年10月4日至
10年6月20日所儲起
的建堂基金奉獻：
\$694,397.00

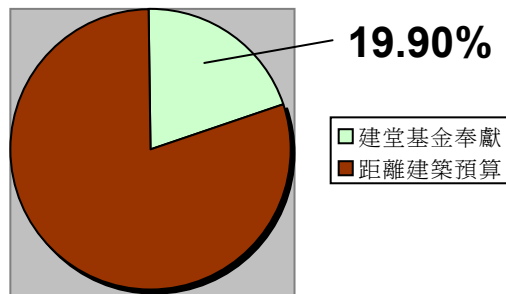

擴堂報告

仕嘉堡華人宣道會
100627

上帝繼續施恩給仕宣！

凡等候耶和華，心裡尋求祂的，耶和華必施恩給他。《耶利米哀歌》3:25

（一）建築證 Full Permit：等了又等，市政府終於在6月23日簽發「建築證」。從此，擴堂的所有工程可以繼續進行。敬請大家同心禱告工人的安全；另求主保守建築進度，預計整個工程完成（包括擴堂大樓、停車場與園林範圍）及獲發入伙紙需時一年。



（二）工程進度：感謝主，地基建工程已順利完成。建築經理會繼續進行第三幅地的渠務及擴堂大樓的上蓋工程。

（三）建堂委員會：成員將會定期到地盤視察監工。我們亦計劃在夏天期間完成整個擴堂的室內設計及有關家具 / 器材的預算。會眾如對此有任何意見及構思，歡迎聯絡鄧天太牧師 (ttptang@hotmail.com)。

（四）銀行貸款：銀行只給我們共六次的提款，而每一次均需長議會財政長老預備詳細的財務報告、劃則師簽發證書 Certificate 及最後經銀行聘請的獨立建築公司審批，求主看顧這些煩複的程序。

（五）房間及停車安排：再次感激弟兄姊妹對擴堂工程期間安排的體諒和遷就，願天父記念大家的捨己犧牲！

*屬靈反思：自2004年10月會友大會通過擴堂計劃至今，我們足足等了差不多六年時間才獲發建築證，當中經歷了各種的艱難（市政府用地圖則及建築證申請、圖則更改、銀行貸款申請、律師對會章的要求、區會職員會的審批、教會內部的變遷...）。但經歷過後，我們是更加倚靠神，更願意將擴堂分別為聖獻給神！同時，我們深信上帝要藉擴堂大樓常常提醒大家：祂仍然施恩給仕宣，仍然與我們同在！盼望擴堂大樓能在2011年教會三十週年堂慶時落成，榮耀主耶穌基督的名！

2010年5月至6月地基建築工程

