

擴堂圖則開支

2008年4月6日特別會友大會通過新的擴堂圖則至2009年3月31日：


- 劃則師費用：\$82,300.19
- 工程顧問費用：\$7,576.42
- 律師費用（將業權註冊更正為加拿大東區區會）：\$1,101.59

合共：\$90,978.20

50 萬籌款運動

奉獻操練：擴堂發展是仕宣這個大家庭一起回應上帝的心意。我們祈求神賜信心給我們，好叫各人積極回應神家擴展的需要。當然，聖經的原則是「多給誰，便向誰多取」（路12:48）。能力大一點的可以多付一點；能力不足的，也可按信心程度奉獻。對整個教會而言，我們正在經歷信心與擺上的操練！

08年10月4日至09年3月29日所收到的建堂基金：\$229,280.60

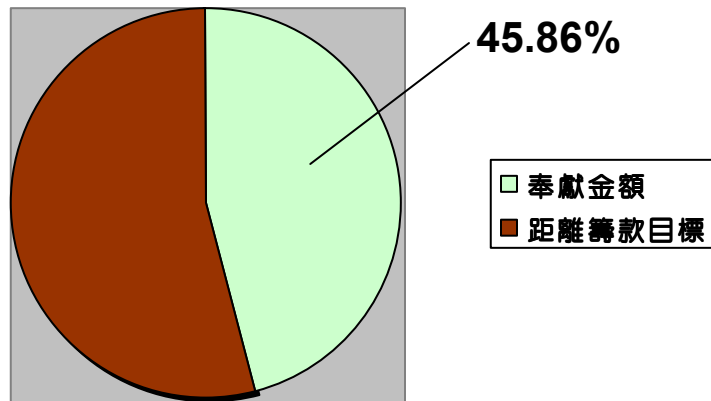

擴堂報告

仕嘉堡華人宣道會
090405

要剛強壯膽事奉神!

耶和華說：這地的百姓，你們當剛強作工，因為我與你們同在。

哈該書 2:4

擴堂的計劃在三月份裡遇到「驚險」的事。當我們在3月9日與市政府會面時，其中一個部門主管反對我們使用減免10個車位的輕微差距（註：本來我們在2008年6月4日得到社區計劃主任的電郵確認可以使用），並且不滿意我們原有139停車場行車通道有多處地方的尺寸未符合標準（註：139停車場的圖則是在1996年時已獲市政府通過）。市政府即時的結論是要我們就以上的情況申請輕微差距，以致解決再次有「車位不足」的問題。

建堂委員會的立場是不會輕易申請輕微差距，因為這會將申請建築證的程序拖延至少四個多月。感謝神，經與劃則師研究後，我們已順利將圖則修改；並且在無須申請輕微差距的情況下，完全符合市政府的要求。新修改的90%工作圖則已於上週遞交市政府。唯一不理想的是，我們多用了三週的時間去修改圖則；故此，原先預計獲發建築證及動工時間可能要由五月份，押後至六月份！求主帶領市政府能有效率完成圖則審批。

不過，我們仍有其他良好的工作進展向大家報告。長議會財政已跟一間銀行初步達成財務安排協議，待四月份長議會決定後，便會向會眾詳細交待。另外，我們已經就建築期間的房間安排向一些部門/組別諮詢意見。在此感謝大家體諒將會引起的短暫不便。最後，我們的建築經理也積極為建築工程的展開作準備，包括定下各工程項目的預算及提議合適的外判公司給建堂委員會。

求主繼續保守我們所作的工有果效，更求主賜我們信心及智慧為擴堂工程作更好的準備。

你的參與！



擴堂異象：傳揚基督

四個崇拜禮堂可作敬拜、福音聚會、聚餐、團契、主日學等之用



擴堂異象：建立生命

二樓有基教部的資源中心
地庫有兒童事工的設施



擴堂異象：建立社群

一樓有開放式落地玻璃茶室
(設有接待處及小食櫃檯)
供弟兄姊妹及親友相交分享



姓名：_____ 所屬團契：_____

電話：_____ 電郵：_____

我願意在擴堂期間積極為擴堂事工祈禱（可選多於一項）：

- 個人每週定時為擴堂事工代禱
- 在所屬的團契／小組發動為擴堂祈禱

我願意參與有關擴堂之事奉：

- 設計
- 裝修
- 家具／器材採購
- 家具製作／裝嵌
- 搬運
- 停車場管理
- 清潔
- 其他：_____

我對擴堂設施的建議：

我對擴堂的心願：

*請將填妥的回應表交回鄧天太牧師的信箱，所有資料只供建堂委員會參考及跟進。
