

## 擴堂開支

2008年4月6日特別會友大會通過新的擴堂圖則至2010年1月15日：


- 劃則師 + 工程顧問費用：	\$156,421.54
- 建築經理聘用費：	\$15,067.50
- 電力公司（訂購變壓器）：	\$47,148.15
- 市政府（用地圖則申請）：	\$137,158.63
- 市政府（建築證申請）：	\$66,041.14
- 律師費用（將業權註冊更正為加拿大東區區會）：	\$1,101.59
- 銀行建築貸款申請費：	\$7,500.00
- 教會物業估價費用（用作申請銀行建築貸款之用）：	\$6,930.00

合共： **\$437,368.55**

\* 以上開支已從教會歷年所累積的儲備基金(Sinking Fund)支付。

建築預算：\$3,489,314.20

08年10月4日至  
10年1月10日所儲起  
的建堂基金奉獻：  
\$559,110.05

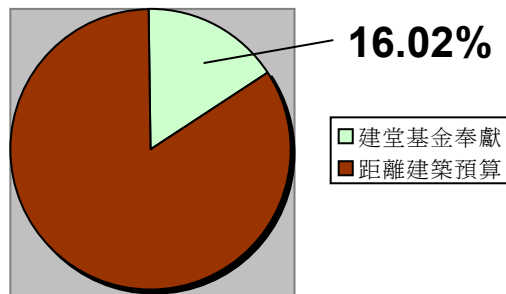

## 擴堂報告

仕嘉堡華人宣道會

100117

### 渴慕建造神的殿

「你們要上山取木料，建造這殿，我就因此喜樂，且得榮耀。」

這是耶和華說的。哈該書1:8


（一）建築證申請：在12月底時，市政府給我們兩個跟進要求：1) 向安省教育廳申請托兒所牌照；及2) 較早前「輕微差距」Minor Variance 不得使用，要重新計算地積比率及車位。就1)的要求，建堂委員會已去信澄清，我們的兒童事工設施只限於教會聚會用途，並不涉及開設日托。另就2)的要求，劃則師亦去信澄清所有有關「輕微差距」事宜、地積比率計算及車位數量早已在「用地圖則」申請上獲得通過。請大家代禱，讓市政府可以早日完成審批。

（二）變壓器安裝工程：因12月份有聖誕假期及天氣長期徘徊在嚴寒溫度，電力公司延遲到1月13日才派員來教會視察，並准許安裝工程的展開。有關資料詳見第2-3頁。

（三）室內設計：建堂委員會已與兒童事工部落實未來兒童事工地庫的設計概念，主題會是「羊圈」。另有關崇拜禮堂、資源中心、餐室及整體設計也有初步構思。

（四）50萬籌款運動：感謝弟兄姊妹的忠心奉獻。在09年12底，我們已完成籌款目標。有關的建堂基金奉獻會一直「儲起」留待將來償還建築貸款或建築期間現金週轉之用。故此從本主日開始，我們會報告所「儲起」的建堂基金奉獻跟建築預算比較，以作參考。

## 變壓器安裝工程

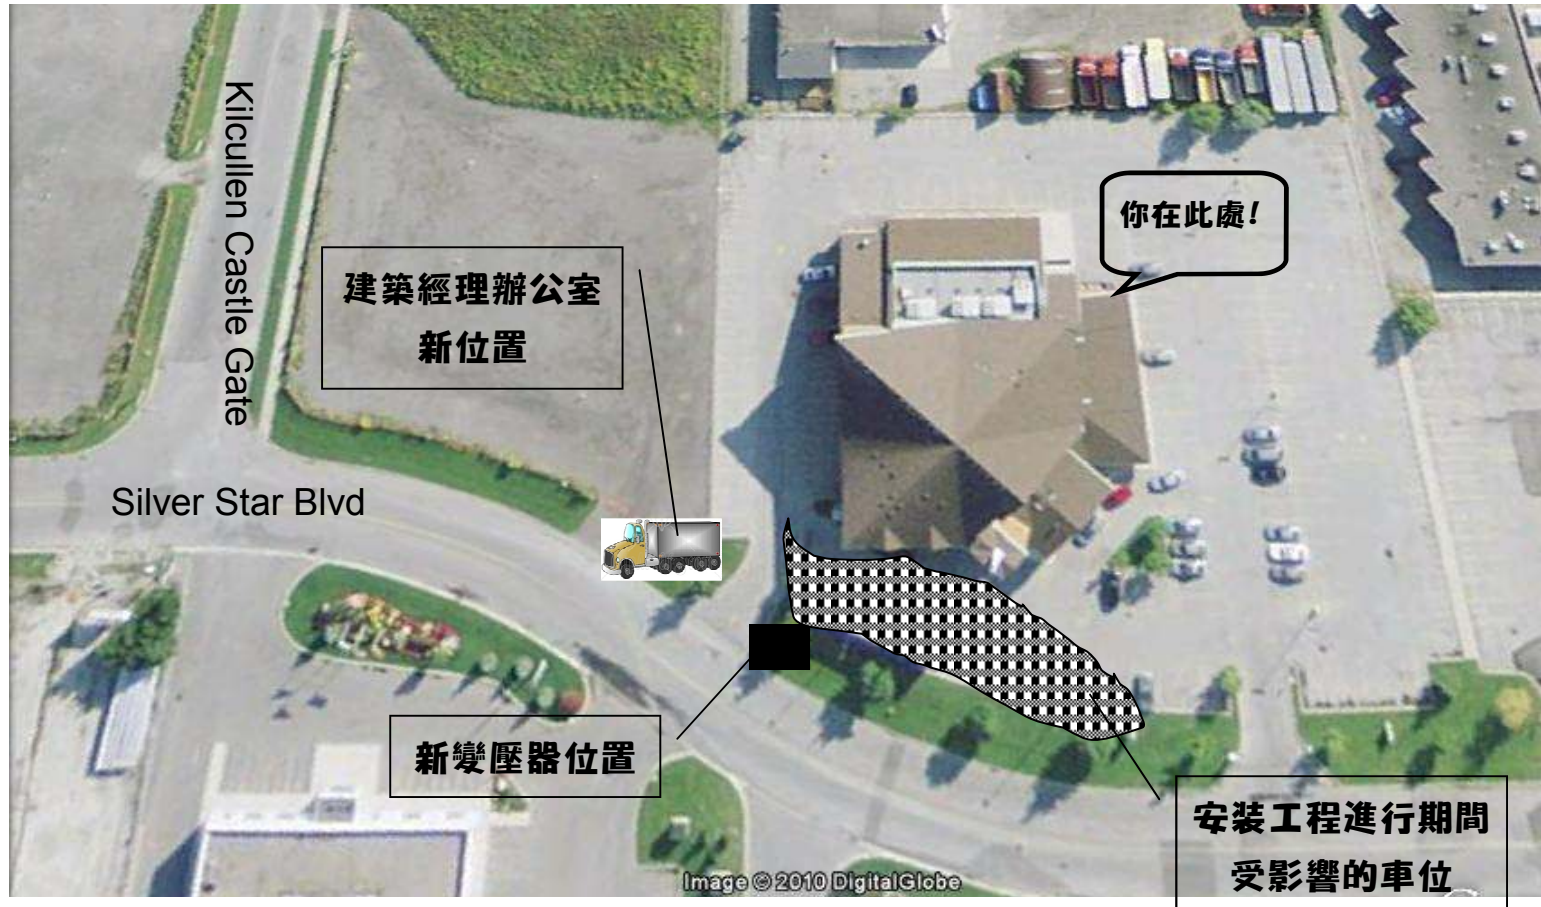

### 安裝工程時間表:

- 1月25至29日： 挖泥機及建築器材將會運到教會。
- 1月底至2月初： 在氣溫和暖的情況下，將會掘地安裝地下電線及鋪石屎平台。
- 2月初： 變壓器將會送到教會並進行安裝。
- 2月中： 教會會有兩個工作天截斷電力供應，並需要關閉，待日子定實後會向會眾報告。
